

# 事業再評価の 重点化・効率化について(審議)

2022年3月9日

みち、ひと…未来へ。



# 1. 道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目




「道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目」(H30.3.12)において、再評価の手法に係る、重点化・効率化が規定されている。

・「**重点審議** (従来審議方法) 」と「**要点審議**」に**分類し審議**を行うことが可能。

➡  
前回評価時から、事業を巡る社会経済情勢等の変化が無く、  
事業費・事業期間の増加が無い若しくは10%以内の場合で、  
費用対効果分析に関する影響要因の変化等に大きな変化が見られない事業は、  
資料作成、費用対効果分析を省略した要点審議とすることができる。

・**審議方法**については、**事業評価監視委員会が決定**する。(再評価実施要領 第6の4)

## 2. 今後の審議方法 再評価の重点化・効率化に係る確認フロー

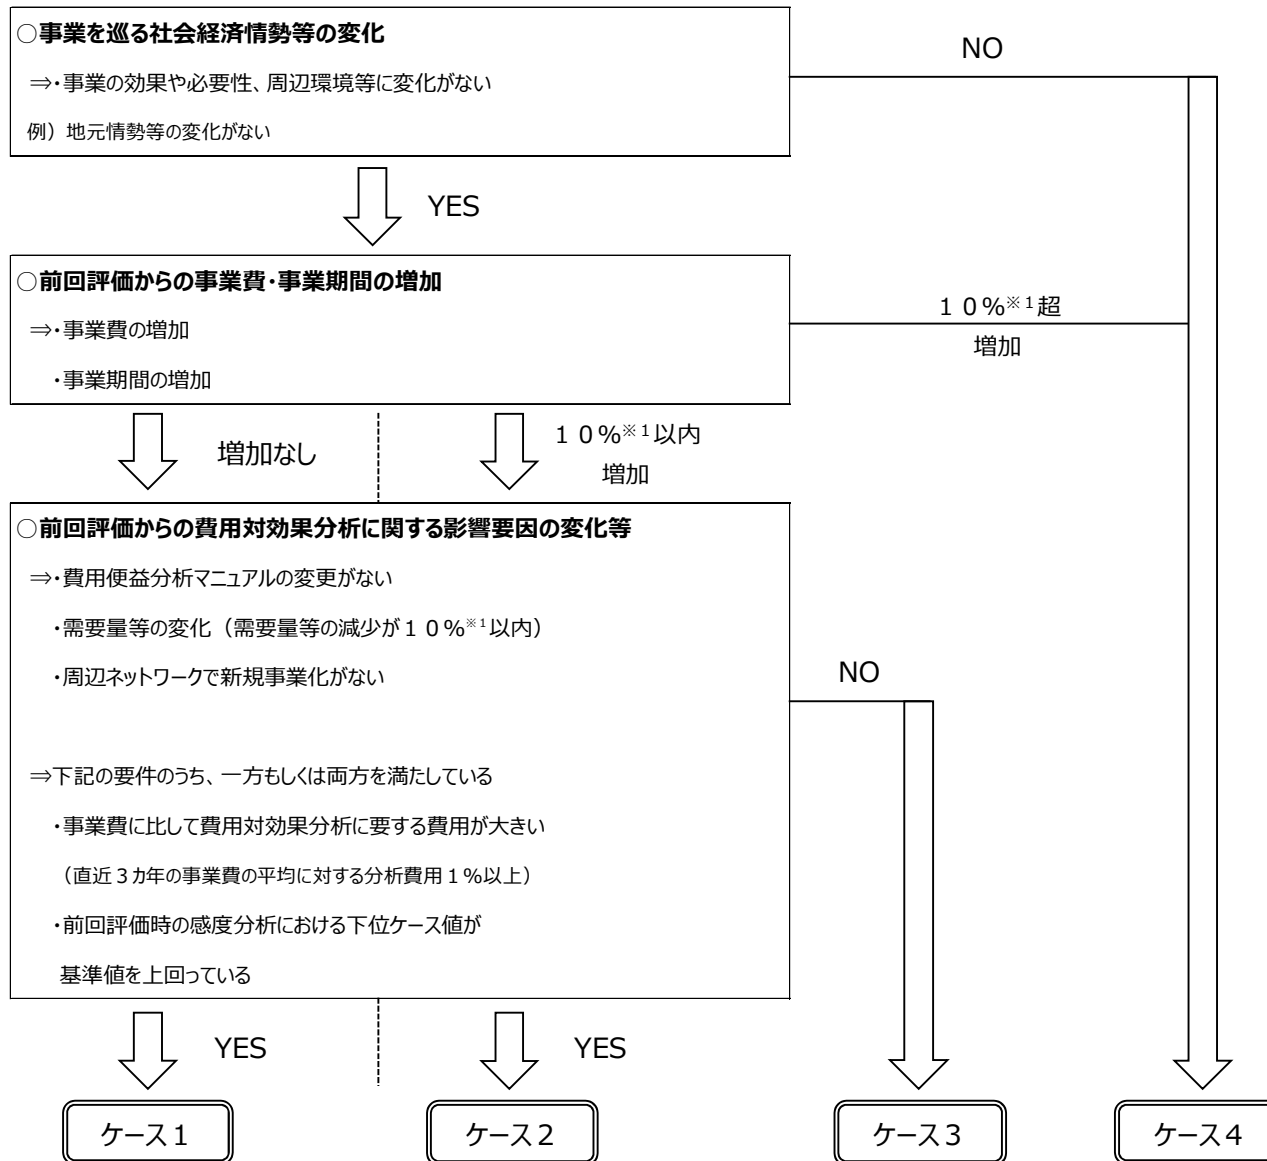

※1 感度分析の範囲を参考に記載しているが、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる

### 3. 今後の審議方法

## 確認後 ケース別の審議区分・資料等の作成方法

	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
社会経済情勢等の変化	無し	無し	無し	有り
事業費・事業期間	増加無し	10% <sup>※1</sup> 以内増加	増加無し 又は 10% <sup>※1</sup> 以内増加	10% <sup>※1</sup> 超増加
B/C影響要因変化 等	無し	無し	有り	—
審議区分	要点	要点 <sup>※3</sup>	要点 <sup>※3</sup>	重点
資料	省略 <sup>※2</sup>	省略 <sup>※2、※3</sup>	省略 <sup>※2、※3</sup>	作成
費用対効果分析	省略	省略	実施	実施

※1 感度分析の範囲を参考に記載しているが、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる

※2 事業の進捗状況、進捗の見通しのみを更新、  
部分供用等があり「今後の評価に必要なデータの取得が必要な場合」はデータの取得のみ実施

※3 事業費・事業期間・B/C影響要因の変化状況を踏まえ、必要に応じ、資料作成・重点審議を実施

※ 資料・費用対効果分析の省略は、2回以上連続して実施しない

# 4. 今後の審議方法 要点審議時の説明資料 (様式・一覧表)



西日本高速道路株式会社 事業評価監視委員会 再評価 要点審議

事業名 (箇所名)	実施箇所	再評価理由 ※1	新規事業 採択時評 価年度	前回再評 価年度	事業期間等	総事業費(億円) 上段: 前回評価時 下段: 現時点	事業を巡る社会 経済情勢等の変 化	主な事業の進捗 状況	主な事業の進捗 の見込み	コスト削減や代替 案等の可能性	事業の効果等	事業の投資効率性		感度分析		都道府県・政令 市等の意見	対応方針 (原案)	
												【事業全体】 総便益B: ○○億円 総費用C: ○○億円 B/C=○○	【残事業】 総便益B: ○○億円 総費用C: ○○億円 B/C=○○	【事業全体】 B/C=○~○ (需要量 ±10%) B/C=○~○ (事業費 ±10%) B/C=○~○ (事業期間±1年)	【残事業】 B/C=○~○ (需要量 ±10%) B/C=○~○ (事業費 ±10%) B/C=○~○ (事業期間±1年)			
1 ○○自動車道 (○○~○○)	自: ○○県○○市 至: ○○県○○町		H○○	R○○	○○年度事業化 ○○年度用地着手 ○○年度工事着手	0,000 0,000 (+○○)												事業継続
2																		
3																		
4																		
5																		

※1 再評価理由  
 ①: 事業採択後3年間が経過した時点で未着工の事業  
 ②: 事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業  
 ③: 準備・計画段階で3年間が経過している事業  
 ④: 再評価実施後5年間が継続している事業  
 ⑤: その他

※費用対効果分析を実施せず、前回評価時点の結果を適用する場合には、  
 「注: 費用対効果分析に係る項目は○年評価時点」との注釈を追記する。

- ・様式・一覧表に補足資料を付けて審議
- ・事業費や事業期間の見直しがある場合は、その説明資料を付けて審議

# 4. 今後の審議方法

## 要点審議時の説明資料 (補足資料 (イメージ))



<p><b>1. 事業概要</b></p> <p>事業区間：自)〇〇県〇〇市〇〇(〇〇IC) 至)〇〇県〇〇市〇〇(〇〇IC)</p> <p>計画延長・幅員：150km・23.5m</p> <p>車線数：4車線</p> <p>計画交通量：30,000～50,000台/日</p> <p>事業化：平成〇年度</p> <p>全体事業費：(前回)約〇〇億円(今回)約〇〇億円</p>	<p><b>5. 概要図</b></p>																				
<p><b>2. 事業の進捗状況</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・当該事業区間の用地取得率は100%</li><li>・設計が一部完了し工事発注に向けた準備中</li></ul>	<p><b>6. (説明事項)</b></p>																				
<p><b>3. 主な事業の整備効果</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・物流効率化の支援(国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上)</li><li>・災害への備え(被災地における復旧復興支援、代替路線の形成)</li><li>・安全で安心できるくらしの確保(三次医療施設へのアクセス向上)</li></ul>																					
<p><b>4. 費用対効果分析結果</b></p> <table><thead><tr><th></th><th colspan="2">【事業全体】</th><th>【残事業】</th></tr><tr><th></th><th>(前回)</th><th>(今回)</th><th>(今回)</th></tr></thead><tbody><tr><td>総便益B:</td><td>〇〇億円</td><td>〇〇億円</td><td>B:〇〇</td></tr><tr><td>総費用C:</td><td>〇〇億円</td><td>〇〇億円</td><td>C:〇〇</td></tr><tr><td></td><td>B/C=〇.〇</td><td>B/C=〇.〇</td><td>B/C=〇.〇</td></tr></tbody></table>		【事業全体】		【残事業】		(前回)	(今回)	(今回)	総便益B:	〇〇億円	〇〇億円	B:〇〇	総費用C:	〇〇億円	〇〇億円	C:〇〇		B/C=〇.〇	B/C=〇.〇	B/C=〇.〇	<p><b>7. 対応方針(原案)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・事業継続とする</li><li>・本事業は、高規格道路ネットワークを形成する有料道路であり、沿線地域の産業、経済の発展等の観点から、事業の必要性・重要性は高く、整備による効果発現を図ることが適切である。</li></ul>
	【事業全体】		【残事業】																		
	(前回)	(今回)	(今回)																		
総便益B:	〇〇億円	〇〇億円	B:〇〇																		
総費用C:	〇〇億円	〇〇億円	C:〇〇																		
	B/C=〇.〇	B/C=〇.〇	B/C=〇.〇																		
